



ADAP

Ad'Ap Ville de Grenoble

BILAN 2018-2019



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments sportifs

TOTAL € TTC	129 166,00 €
-------------	--------------

Bâtiments culturels

TOTAL € TTC	76 953,00 €
-------------	-------------

Bâtiments scolaires

TOTAL € TTC	291 420,00 €
-------------	--------------

Bâtiments socio-culturels

TOTAL € TTC	101 005,00 €
-------------	--------------

Bâtiments territorialisés

TOTAL € TT	24 657,00 €
------------	-------------

Autres bâtiments publics

TOTAL € TT	17 788,00 €
------------	-------------

TOTAL 2018	640 989,00 € TTC
-------------------	-------------------------



ADAP : Bilan 2018

Equipements rendus conformes au titre de l'accessibilité en 2018

- + 1 Ecole maternelle
- + 1 Ecole élémentaire
- + 3 Equipements sportifs
- + 1 Equipement culturel

Pour un montant total de 641 k€ TTC


- **SOIT 6 EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES TOTALEMENT CONFORMES EN 2018 (en plus des 13 déjà conformes) => 19 EQUIPEMENTS CONFORMES EN 2018**
- **Objectif de conformité réglementaire imposé** dans le cadre de l'Adap. La conformité réglementaire n'induit pas automatiquement une accessibilité totale (Exemple: un bâtiment pourra être conforme = tous les travaux imposés par la réglementation ont été réalisés mais le bâtiment ne sera pas 100% accessible car un point aura été traité par dérogation pour raison technique).



Accessibilité des ERP BILAN 2018

Comparaison par rapport au 1^{er} janvier 2015. 49% des ERP accessibles en 2018, au lieu de 39% en 2015


Accessibilité Motrice

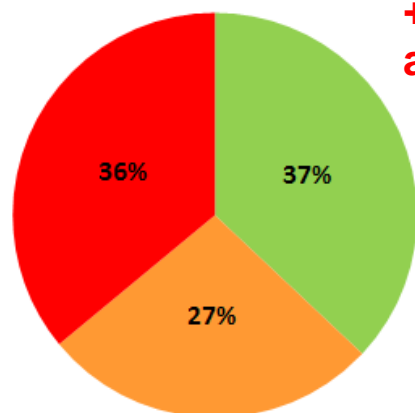

+ 10 % praticable en autonomie

- Praticable de façon autonome
- Praticable avec accompagnement
- Non accessible


Accessibilité Visuelle

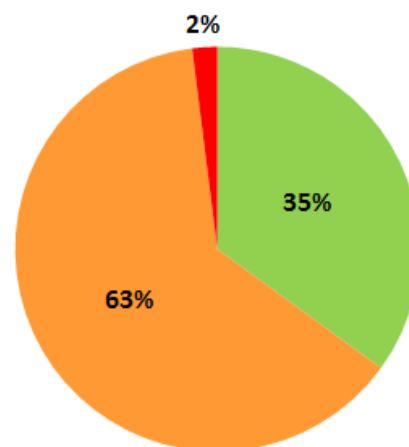

+ 16 % praticable en autonomie

- Praticable de façon autonome
- Praticable avec accompagnement
- Non accessible


Accessibilité Auditive

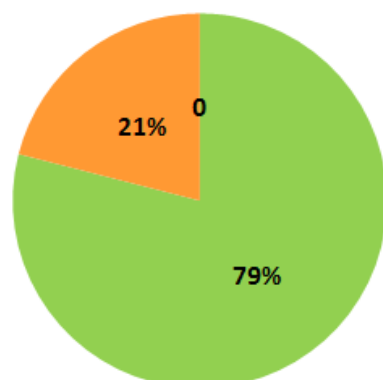

+ 2% praticable en autonomie

- Praticable de façon autonome
- Praticable avec accompagnement
- Non accessible

Accessibilité Intellectuelle



+ 21 % praticable en autonomie

- Praticable de façon autonome
- Praticable avec accompagnement
- Non accessible

Données relatives au niveau d'accessibilité en terme d'usages, par type de handicap, (Exemple: un équipement pourra être globalement accessible sans pour autant être conforme au titre de la réglementation. Ce sera le cas, par exemple, lorsque le WC PMR existe mais que des équipements tels que barre d'appui, ou lave mains ne sont pas à hauteur réglementaire ou sont manquants).



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments sportifs

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	PREVISION REALISATION	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018							
4	GYMNASE ALPHONSE DAUDET	Gymnase	Création de sanitaires pour bureau de vote (1 bloc dédié), reprise enrobés et marche (traitement entrée), création de douches et vestiaires		Reporté 2020		2020
5	GYMNASE LEON JOUHAUX	Gymnase	Remplacement poignée porte d'entrée principale, déplacement boîte à lettre à hauteur et distance angle conforme, tapis PMR dans VSD 1, sécurisation escaliers d'accès au bureau des entraîneurs Boxe, changement bloc porte, traitement ressaut, mise en conformité VSD adaptés 1 et 2, pose flashes lumineux dans sanitaires	Travaux terminés		2 610,00 €	2018
3	GYMNASE HOUILLE BLANCHE	Gymnase	Réfection cheminement extérieur et création rampe d'accès au bâtiment + Quelques trx d'adaptation dans sanitaires/vestiaires par SIP	Travaux terminés		24 346,00 €	2018
2	GYMNASE VIEUX TEMPLE	Gymnase	Cheminement extérieur: Sécurisation des escaliers et reprise du dévers de la rampe, accès à l'équipement: traitement du ressaut + tapis PMR, création de 2 WC adaptés, création d'une douche adaptée, mise aux normes du vestiaire (barre d'appui)		Reporté 2021		2021
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018							
2	CENTRE SPORTIF HOICHE	Centre sportif	Sécurisation escaliers, mise aux normes ascenseur	Travaux terminés		58 969,00 €	2020
6	GYMNASE LES TREMBLES	Gymnase	Suite et fin trx 2017: Mise aux normes du cheminement extérieur, sécurisation de l'escalier adjacent au cheminement intérieur, mise aux normes du sanitaire adapté + installation lavabo commun adapté, mise aux normes espace douches, signalétique	Travaux terminés		42 290,00 €	2018
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018							
3	GYMNASE ADOLPHE PEGOUD	Gymnase	Sécurisation de l'escalier d'accès du RDC au niveau inférieur qui dessert les salles de sports: trx en cours	Travaux terminés		951,00 €	2024
TOTAL € TTC						129 166,00 €	



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments culturels

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	PREVISION REALISATION	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018							
2	BIBLIOTHEQUE CENTRE VILLE	Bibliothèque	Sécurisation escalier, mise aux normes ascenseur, remplacement sol, installation 2 BIM au 1er étage (salle Presse + zone renseignements salle de lecture)	Travaux terminés		9 465,00 €	2020
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018							
2	BIBLIOTHEQUE D'ETUDES ET DU PATRIMOINE LYAUTEY	Bibliothèque	Adaptation porte sanitaires du WC PMR du 6ème étage: installation serrure et poignée déportée	Travaux terminés		930,00 €	2020
4	CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL	Enseignement	Sécurisation escaliers extérieurs, reprises surfaces sols extérieur, sécurisation marche/rupture niveau proche du cheminement tapis PMR, sécurisation escaliers intérieurs (salles Steckel et Orgue + étages + bibliothèque), signalisation obstacle hauteur <2,20m, poignée rallongée sur porte, signalétique	Travaux terminés		36 038,00 €	2024
4	BIBLIOTHEQUE ALLIANCE	Bibliothèque	Pose éclairage extérieur avec détection présence, remplacement tapis/grilles devant 2 entrées annexes, sécurisation des escaliers intérieurs, mise aux normes ascenseur, création rampe intérieure pour accès terrasse, création WC PMR à l'étage avec flash lumineux, installation boucle magnétique sur 1 bureau accueil avec pictogramme sur bureau + à l'entrée principale du bâtiment	Travaux terminés		30 470,00 €	2018
2	HOTEL DE LESDIGUIERES CINÉMA JULIET BERTO	Salle spectacle	Etude + estimation réalisation rampe	Etude terminée		0	2022
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018							
1	BIBLIOTHEQUE SAINT BRUNO	Bibliothèque	Déplacement du WC contre la cloison du mur, déplacement de la barre d'appui : hauteur comprise entre 0.70 et 0.80m, déplacement du papier toilette coût= 0€ car pas de fournitures (SIP)	Travaux terminés		50,00 €	2020
TOTAL € TTC						76 953,00 €	



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	PREVISION REALISATION	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018							
2	ECOLE MATERNELLE JARDIN DE VILLE	Maternelle	Visiophone, blocs portes, sécurisation escalier, création rampe	Travaux terminés		11 203,00 €	2024
3	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE France MATERNELLE	Maternelle	Amélioration signalétique , visiophone, amélioration sanitaires		Reporté 2019		2019
3	GROUPE SCOLAIRE ANATOLE France ELEMENTAIRE	Elémentaire	Amélioration signalétique , visiophone, amélioration sanitaires		Reporté 2019		2019
6	ECOLE ELEMENTAIRE LE VERDERET	Elémentaire	Mise en conformité ascenseur , mise en conformité sanitaires, sécurisation escaliers		Reporté 2020		2020

Ecole maternelle Buffon + Ecole maternelle / élémentaire Paul Painlevé + Ecole maternelle / élémentaire Elisée Châtain identifiées dans bilan 2017 : travaux maîtrise d'ouvrage livraison 2019



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018						
4	LOCAL DEFICIENTS VISUELS ECOLE PRIMAIRE F BUISSON	Primaire	Sécurisation escalier extérieur accès établissement + création espace sanitaire adapté	Travaux terminés	25 496,00 €	2022
5	ECOLE ELEMENTAIRE MALHERBE	Elémentaire	Sécurisation des escaliers extérieurs, remplacement sonnette par visiophone, remplacement vantaux bloc porte entrée, renforcement éclairage extérieur existant, mise en sécurité des escaliers intérieurs, déplacement boîte à lettre	Travaux terminés	72 892,00 €	2024
5	ECOLE MATERNELLE MALHERBE	Maternelle	Reprise accès principal (rampe + porte + sécurisation escalier + visiophone), création rampe conforme PMR côté cour (accès salle motricité), changement bloc porte (accès salle motricité), sécurisation 3 escaliers extérieurs, changement porte 2ème porte accès principale et 2ème porte accès salle motricité (=amélioration)	Travaux terminés	72 892,00 €	2024
6	GROUPE SCOLAIRE MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC ELEMENTAIRE	Elémentaire	Traitement ressaut, visiophone, déplacement boîte à lettre, mise en conformité WC PMR	Travaux terminés	9 580,00 €	2018
6	GROUPE SCOLAIRE MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC MATERNELLE	Maternelle	Sécurisation escaliers, mise en conformité WC PMR	Travaux terminés	9 580,00 €	2018



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires

6	ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES	Elémentaire	sécurisation de l'escalier de 3 marches en liaison à la bibliothèque	Travaux terminés	950,00 €	2019
6	ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC	Elémentaire	Sécurisation 2 escaliers intérieurs, signalisation sur porte accès locaux, changement hauteur boîte lettre, installation visiophone	Travaux décalés aux vacances de février 2019	26 232,00 €	2021
5	ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET ELEMENTAIRE	Elémentaire	Création rampe, sécurisation escaliers, blocs portes, création sanitaires PMR dans bâtiment central commun maternelle/primaire	Travaux terminés	19 385,00 €	2024
5	ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET MATERNELLE	Maternelle	Création rampe, sécurisation escaliers, blocs portes, création sanitaires PMR dans bâtiment central commun maternelle/primaire	Travaux terminés	19 385,00 €	2022
1	GROUPE SCOLAIRE NICOLAS CHORIER ELEMENTAIRE	Elémentaire	Reprise de la rampe réalisée dans le cadre de l'opération de travaux 2017 jugée non conforme par le bureau de contrôle	Travaux terminés	2 208,00 €	Déjà accessible
1	GROUPE SCOLAIRE NICOLAS CHORIER MATERNELLE	Maternelle	Reprise de la rampe réalisée dans le cadre de l'opération de travaux 2017 jugée non conforme par le bureau de contrôle	Travaux terminés	2 208,00 €	Déjà accessible
1	ECOLE ELEMENTAIRE ANTHOARD	Elémentaire	Sécurisation escaliers extérieurs	Travaux terminés	11 580,00 €	2019
3	GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE ELEMENTAIRE	Elémentaire	Création de sanitaires au RDC+1: étage actuellement non accessible aux personnes circulant en fauteuil donc sanitaire non PMR mais aménagé avec cloisons mobiles dans surface suffisante permettant mise en accessibilité ultérieure	Travaux terminés	- €	2024



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018						
1	ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPH VALLIER	Elémentaire	Mise en conformité WC PMR (déplacement cuvettes + équipements + pictogramme) + signalétique numéro voirie sur bâtiment:	Travaux terminés	25,00 €	2021
2	ECOLE MATERNELLE JULES VERNE - EAJE ILOT MARMOTS	Maternelle	Installation visiophones	Travaux terminés	6 478,00 €	2023
5	ECOLE ELEMENTAIRE MALHERBE	Elémentaire	Transformation du WC adapté RDC de l'aile Ouest pour accueil élève 6ème en 2018: Pose 2 barres appui amovibles, remplacement cuvette existante de 50 cm de haut par cuvette de 40 cm de haut selon préconisations ergothérapeute	Travaux terminés	1 326,00 €	2024
TOTAL € TTC					291 420,00 €	

"INVESTISSEMENT" - INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019

AUCUN



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments socio-culturels

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018						
3	MJC DES EAUX CLAIRES	MJC	Installation d'une BIM à l'accueil Installation d'un tapis PMR	Travaux terminés	2 511,00 €	2022
5	MAISON DE L'ENFANCE TEISSEIRE	Maison enfance	Installation d'une BIM à l'accueil avec signalétique adaptée	Travaux terminés	1 750,00 €	2022
1	ANNEXE WALDECK ROUSSEAU MJC PARMENTIER	MJC	Sécurisation escaliers, mise en place paillason PMR, installation BIM accueil	Travaux terminés	4 562,00 €	2022
7	MAISON DES COLLINES	Centre de Loisirs	<u>BUREAUX ACCUEIL</u> : Pose de signalétique sur WC PMR, installation d'un dispositif de fermeture derrière soi sur porte WC PMR <u>BATIMENT MATERNELLE RDC BAS</u> : Création d'une pente conforme avec palier de repos, sécurisation des escaliers, changement des vantaux de la porte accès dont un vantail en 0,90 et traitement du ressaut par pente inférieure à 33%, sécurisation de l'escalier <u>BATIMENT MATERNELLE RDC HAUT</u> : Sécurisation des escaliers, changement des vantaux de la porte accès dont un vantail de 0,90m, installation dispositif de fermeture derrière soi sur porte WC PMR <u>RESTAURANT</u> : Sécurisation des escaliers hors pose main courante car escaliers déjà trop étroits (validé par bureau contrôle), déplacement du mobilier pour rendre l'accès accessible, changement des vantaux de la porte accès dont un vantail de 0,90m, installation d'un dispositif de fermeture derrière soi sur porte WC PMR	Travaux terminés	63 024,00 €	2022
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018						
2	MJC MUTUALITE	MJC	Changement du tapis d'entrée, pose boucle magnétique, sécurisation escaliers intérieurs et extérieurs (accès cour)	Travaux terminés	5 580,00 €	2022
4	MJC LUCIE AUBRAC	MJC	Sécurisation 4 escaliers extérieurs, remplacement paillason par paillason conforme PMR	Travaux terminés	14 777,00 €	2020
6	MAISON DES HABITANTS PREMOL MJC PREMOL	MJC	Aménagement d'un WC adapté à l'occasion de la suppression du WC adapté existant à l'occasion des trx de réaménagement du Théâtre	Travaux terminés	8 801,00 €	2019
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018						
AUCUN						
TOTAL € TTC					101 005,00 €	



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments territorialisés

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018						
AUCUN						
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018						
6	MAISON DES HABITANTS PREMOL	MDH	Réaménagement du WC adapté existant à l'occasion de la réorganisation de l'accueil, mise aux normes banque accueil, tapis PMR SAS Entrée, SAS avec 2 portes auto	Travaux terminés	18 586,00 €	2019
4	MAISON DES INITIATIVES		Sécurisation 2 escaliers extérieurs, visiophone, BIM, banque accueil adaptée, remplacement sol par revêtement anti dérapant, blocs portes, création sanitaire adapté, amélioration éclairage	Travaux terminés	6 071,00 €	A définir
"INVESTISSEMENT" - INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019						
AUCUN						
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018						
AUCUN						
TOTAL € TTC					24 657,00 €	



ADAP : Bilan 2018

Autres bâtiments publics

SECT	NOM BATIMENT	TYPE	DESCRIPTIF TRAVAUX	AVANCEMENT	COUT € TTC	CONFORME ACCESS
"INVESTISSEMENT" - REPORT 2017 A REALISER EN 2018						
AUCUN						
"INVESTISSEMENT" - REALISE EN 2018						
6	CENTRE DE SANTE VILLENEUVE	Service	Installation de 3 boucles magnétiques portatives Installation de flashes lumineux raccordées à SSI dans tous les sanitaires (9 unités)	Travaux terminés	7 381,00 €	2021
5	PALAIS DES SPORTS PIERRE MENDES France	Evènementiel	Installation de triflashes dans tous les sanitaires à l'occasion de la réfection du SSI	Travaux terminés	10 407,00 €	2022
"INVESTISSEMENT" - INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019						
AUCUN						
"FONCTIONNEMENT" - REALISE EN 2018						
AUCUN						
TOTAL € TTC					17 788,00 €	



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments sportifs

TOTAL € TTC	169 695,00 €
-------------	--------------

Bâtiments culturels

TOTAL € TTC	76 541,00 €
-------------	-------------

Bâtiments scolaires

TOTAL € TTC	233 994,00 €
-------------	--------------

Bâtiments socio-culturels

TOTAL € TTC	78 574,00 €
-------------	-------------

Bâtiments territorialisés

TOTAL € TT	15 334,00 €
------------	-------------

Autres bâtiments publics

TOTAL € TT	33 911,00 €
------------	-------------

TOTAL 2019	608 049,00 € TTC
-------------------	-------------------------



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

**Bâtiments culturels
Réhab pilotées maîtrise d'ouvrage**

TOTAL € TTC	28 900,00 €
-------------	-------------

**Bâtiments scolaires
Réhab pilotées maîtrise d'ouvrage**

TOTAL € TTC	636 110,00 €
-------------	--------------

**Autres bâtiments publics
Réhab pilotées maîtrise d'ouvrage**

TOTAL € TT	39 200,00 €
------------	-------------

TOTAL 2019	704 210,00 € TTC
-------------------	-------------------------



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Equipements rendus conformes au titre de l'accessibilité en 2019 y compris travaux MOU

- + 7 Ecoles maternelles
- + 7 Ecoles élémentaires
- + 3 Equipements socio-culturels
- + 6 Equipements sportifs
- + 2 Equipements culturels
- + 5 Equipements territorialisés
- + 1 Equipement « Autre »
- **SOIT 31 EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES SERONT TOTALEMENT CONFORMES EN 2019 (en plus des 19 déjà conformes) => 50 EQUIPEMENTS CONFORMES EN 2019**



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments sportifs

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
Centre sportif Hoche	Banque accueil, bloc porte, conformité vestiaires + douches + sanitaires RDC	Travaux en cours	NON	32 500 €
Gymnase C. Munch	Bloc porte entrée et autres, conformité vestiaires + douches + sanitaires	Estimation en cours	OUI	36 000 €
Piscine Clos D'or	Sécurisation escalier extérieur, blocs portes SAS entrée, tapis et grille PMR, signalétique nom équipement, mise en conformité largeur rampe intérieure, protection obstacle, signalétique parois vitrées, installation sonnette Dérogation pour non accessibilité fauteuil dans tous VSD	Travaux prévus à la Toussaint	OUI	20 412 €
Piscine sud Les Dauphins	Signalétique sur mobilier extérieur, signalétique sur parois vitrées SAS entrée et contour piscine, tapis PMR, traitement ressaut pédiluve, sécurisation escaliers gradins, mise aux normes sanitaires adaptés	Travaux prévus à la Toussaint	OUI	10 000 €
Stade R. Espagnac	Sécurisation escaliers gradins	Travaux en cours	NON	10 531 €
Pôle sportif Cocat	Ce bâtiment initialement Espace Jeune Teisseire devient un pôle sportif (espace dojo + musculation) : réaménagement global en 2019 avec mise en conformité accessibilité	Travaux en cours	OUI	15 600 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments sportifs

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
Piscine Jean Bron	Mise en conformité banque accueil côté rue Humbert II avec installation BIM + sécurisation pédiluve côté pataugeoire + BEV escalier accès à 3 pédiluves + Réfection carrelage réalisée en 2016 lors travaux vestiaire adapté côté rue Humbert II	Travaux terminés	NON	27 374 €
Gymnase des Saules	Remplacer bloc porte accès principal, remplacer grille existante par tapis PMR extérieur, abaisser urinoir commun, mettre en conformité WC adapté + 2 vestiaires +2 douches	Estimation en cours	OUI	15 000 €
Gymnase Ampère	Petits travaux : Installation d'une barre d'appui verticale dans les 2 douches adaptées	Travaux terminés	OUI	527 €
Halle de Tennis	Prescriptions visite ouverture : Protection de la partie basse sous l'escalier situé dans l'allée principale , signalisation du piètement de charpente faisant saillie dans le cheminement par réalisation du contraste du socle en béton	Travaux en cours	déjà conforme: amélioration	1 500 €
Gymnase Houille Blanche	Fin travaux conformité Adap bâtementaire: Installation pater à hauteur réglementaire dans vestiaire, remplacement grille au droit rampe extérieure par grille avec fentes inférieures à 2cm	Travaux terminés	déjà conforme: amélioration	101 €
Gymnase Les Trembles	Installation 2 patères à hauteur réglementaire , espace pour permettre l'approche d'un fauteuil d'environ 0,80 x 1,30m au droit de ces paters (suppression banc)	Travaux en cours	déjà conforme: amélioration	150 €
TOTAL € TTC				169 695 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d'ouvrage





Bâtiments sportifs

SECT	NOM BATIMENT	OPERATION	LIVRAISON	REHAB	NEUF	MONTANT ACCESS € TTC
6	CS Jean Philippe Motte	-----	2019		X	Totalement accessible puisque construction neuve




Equipements sportifs : conformité à l'accessibilité

Equipements en conformité

-  Centre sportif / gymnase
-  Piscine
-  Stades
-  Autres équipements

Equipements en conformité en 2019 en fonction de la programmation de travaux

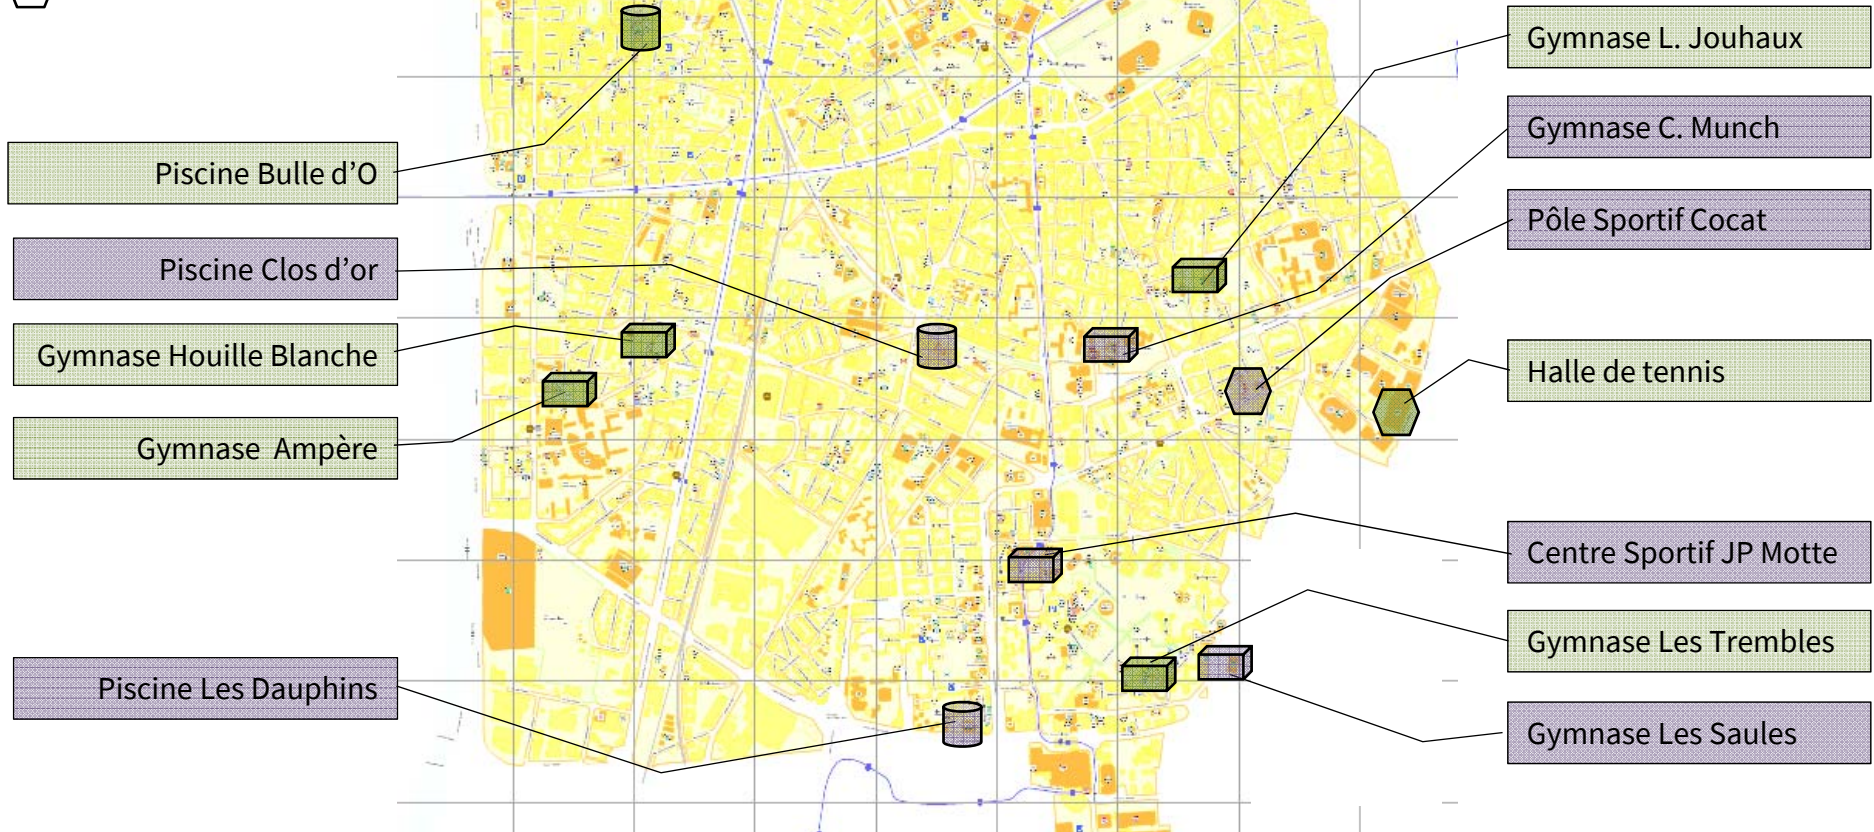



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments culturels

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
Théâtre de Poche	Banque accueil avec cloisonnement dans hall existant, installation d'une BIM	Estimation en cours	OUI	15 000 €
Théâtre Ste Marie d'en bas	Reprise du volume global des sanitaires pour aménager 2 WC non adaptés + 1 WC PMR mixte	Opération reportée	Opération reportée	0 €
Conservatoire à Rayonnement Régional	Mise aux normes du WC PMR du RDC du personnel mis à disposition du public Création emplacements PMR dans salles Steckel et Orgues	Travaux en cours Travaux reportés été 2020 (non chiffrés)	NON	23 865 €
Bibliothèque d'étude et patrimoine - Lyautey	Adaptation banque d'accueil 6ème étage avec installation BIM, sécurisation escaliers accès étages et accès sanitaires du 5ème	Travaux en cours	NON Courant 2020 après trx MOU	30 000 €
Théâtre des Peupliers 2 rue des Trembles	Création WC PMR RDC, déplacement sonnette	Travaux en cours	NON	7 676 €
TOTAL € TTC				76 541 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d'ouvrage

Bâtiments culturels

SECT	NOM BATIMENT	OPERATION	LIVRAISON	REHAB	NEUF	MONTANT ACCESS € TTC
6	Théâtre Prémol	-----	2019	X		28 900 Totalemment accessible



Equipements culturels : conformité à l'accessibilité

Equipements en conformité




Equipements en conformité en 2019 en fonction de la programmation de travaux


Théâtre de Poche

Orangerie Muséum

Bibliothèque Alliance

Théâtre Prémol

-  Musées
-  Salles de spectacle
-  Enseignement
-  Bibliothèques
-  Autres équipements

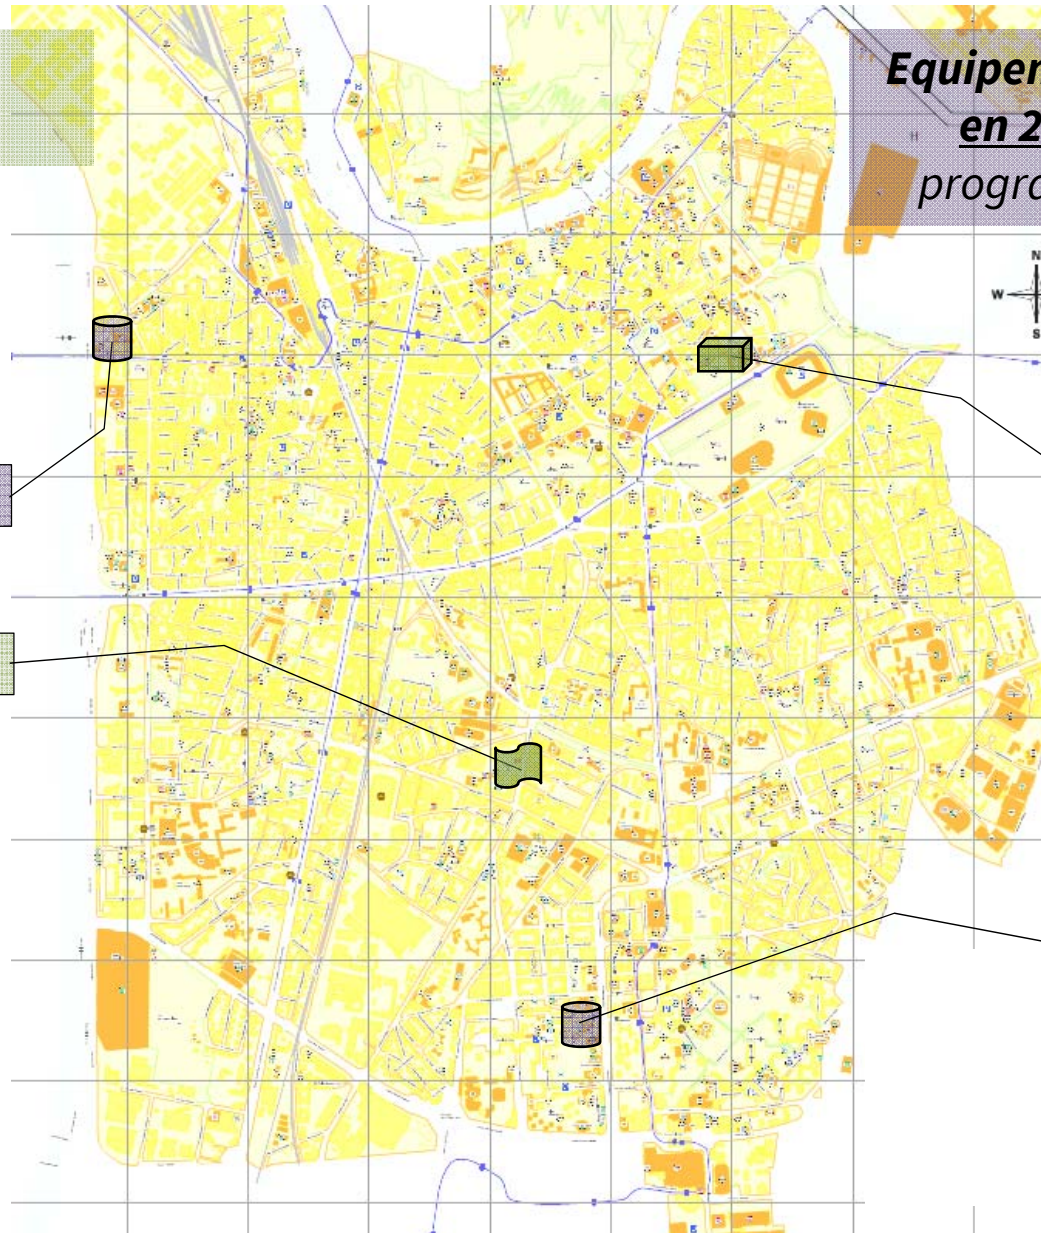



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments scolaires

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
Ecole Elémentaire ANTHOARD	Remplacement grilles eaux pluviales, signalétique, visiophone, boîte à lettre, renforcement éclairage extérieur, bloc porte gymnase, sécurisation escaliers intérieurs, mise aux norme ascenseur, création WC adaptés au R+1 au R+2 et dans restaurant scolaire	Travaux été et Toussaint 2019 sauf création WC adaptés en décembre	OUI	26 000 €
Ecole Maternelle BERRIAT	Signalétique, visiophone, barrière protection obstacle, création rampe accès à cantine Elémentaire Anthoard via cour, blocs portes, sécurisation escaliers intérieurs et extérieurs	Travaux été et Toussaint 2019	OUI	30 000 €
Ecole Elémentaire A. FRANCE	Amélioration signalétique établissement, signalétique sur parois vitrées, sécurisation escaliers extérieurs et intérieurs, déplacement visiophone et boîte à lettres, poignées rallongées sur portes dans angle rentrant, amélioration sanitaires	Travaux été et Toussaint 2019	OUI	25 000 €
Ecole Maternelle A. FRANCE	Protection obstacle (sous escalier), amélioration signalétique établissement, signalétique sur parois vitrées, sécurisation escaliers extérieurs et intérieurs, déplacement visiophone et boîte à lettres, poignées rallongées sur portes dans angle rentrant, amélioration sanitaires	Travaux été et Toussaint 2019	OUI	25 000 €
Restaurant scolaire A. FRANCE	signalisation portes vitrées , lave-mains dans sanitaires	Travaux été et Toussaint 2019	OUI	5 000 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments scolaires

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
Ecole Elémentaire SIDI BRAHIM	Sécurisation escalier intérieur et extérieurs, bloc porte, sécurisation rampe (barrière) Sécurisation escalier extérieure, vitrophanie sur porte entrée du restaurant scolaire	Estimation en cours Travaux Toussaint 2019	OUI	15 000 €
Ecole Maternelle SIDI BRAHIM	Blocs portes, visiophone, tablette mobilier, poignée rallongée, signalétique obstacle	Estimation en cours Travaux Toussaint 2019	OUI	25 000 €
Ecole Maternelle LES FRENES	Traitement ressaut porte entrée, remplacement grille EP, remplacement poignée par poignée rallongée, sécurisation escaliers intérieurs, mise en conformité WC adultes, installation lavabo accessible	Estimation en cours Travaux Toussaint 2019	OUI	30 000 €
Ecole Elémentaire LES TREMBLES	Création rampe accès, réfection cheminement extérieur, mise aux normes WC adapté RDC, création WC adapté R+1, mise en conformité ascenseur, sécurisation escaliers intérieurs, protection obstacle	Estimation en cours Travaux Toussaint 2019	OUI	25 000 €
Ecole Elémentaire CHRISTOPHE TURC	Fin des travaux 2018: grille + tapis encastré PMR	Travaux terminés	NON	3 178 €
Ecole Maternelle MALHERBE	Fin des travaux 2018: reprise rampe PMR et abords non conforme	Travaux terminés	NON	4 800 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments scolaires

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
Ecole Elémentaire MENON SITE HEBERT	Installation d'un visiophone	Travaux en cours	NON	6 020,98 €
Ecole Maternelle CORNELIE GEMOND	Installation d'un visiophone	Travaux en cours	NON	5 995,18 €
Ecole maternelle GERARD PHILIPPE	Fin travaux conformité Adap bâtementaire: Remplacement 4 grilles EP de la cour, renforcement éclairage extérieur de l'entrée	Travaux en cours	déjà conforme: amélioration	1500 €
Ecole Maternelle MARIE REYNOARD- CHRISTOPHE TURC	Fin travaux conformité Adap bâtementaire: Mise en conformité WC RDC, Déplacement boite à lettre à hauteur réglementaire	Travaux en cours	déjà conforme: amélioration	2 000€
Ecole Elémentaire MARIE REYNOARD- CHRISTOPHE TURC	Fin travaux conformité Adap bâtementaire: Mise en conformité WC adapté du R+1 et du restaurant scolaire	Travaux en cours	déjà conforme: amélioration	4 000 €
Ecole Maternelle MARIE REYNOARD- CHRISTOPHE TURC	Adaptation du sanitaire maternelle pour besoin spécifique d'une élève situation de handicap	Travaux en cours	déjà conforme: amélioration	500€
TOTAL € TTC				233 994 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d'ouvrage

Bâtiments scolaires

SECT	NOM BATIMENT	OPERATION	LIVRAISON	REHAB	NEUF	MONTANT ACCESS € TTC
1	Elémentaire Ampère	OSER	2019	X		135 260 Totalemnt accessible
1	Maternelle Ampère	OSER	2019	X		17 790 Totalemnt accessible
3	Elémentaire Paul Painlevé	OSER	2019	X		137 300 Totalemnt accessible
3	Maternelle Paul Painlevé	OSER	2019	X		38 460 Totalemnt accessible
4	Elémentaire Elisée Châtain	OSER	2019	X		265 300 Totalemnt accessible
1	Maternelle Florence Arthaud	-----	2019	X	X	42 000 Totalemnt accessible
1	Maternelle Buffon extension	-----	2019		X	Existant: pas access



Ecoles élémentaires: conformité à l'accessibilité

Elémentaires en conformité

Elémentaires en conformité en 2019 en fonction de la programmation de travaux

Anthoard (26 K€)

Ampère


Painlevé

A. France (30 K€)

Sidi Brahim (5 K€)

E. Chatin


Les Trembles (25 K€)

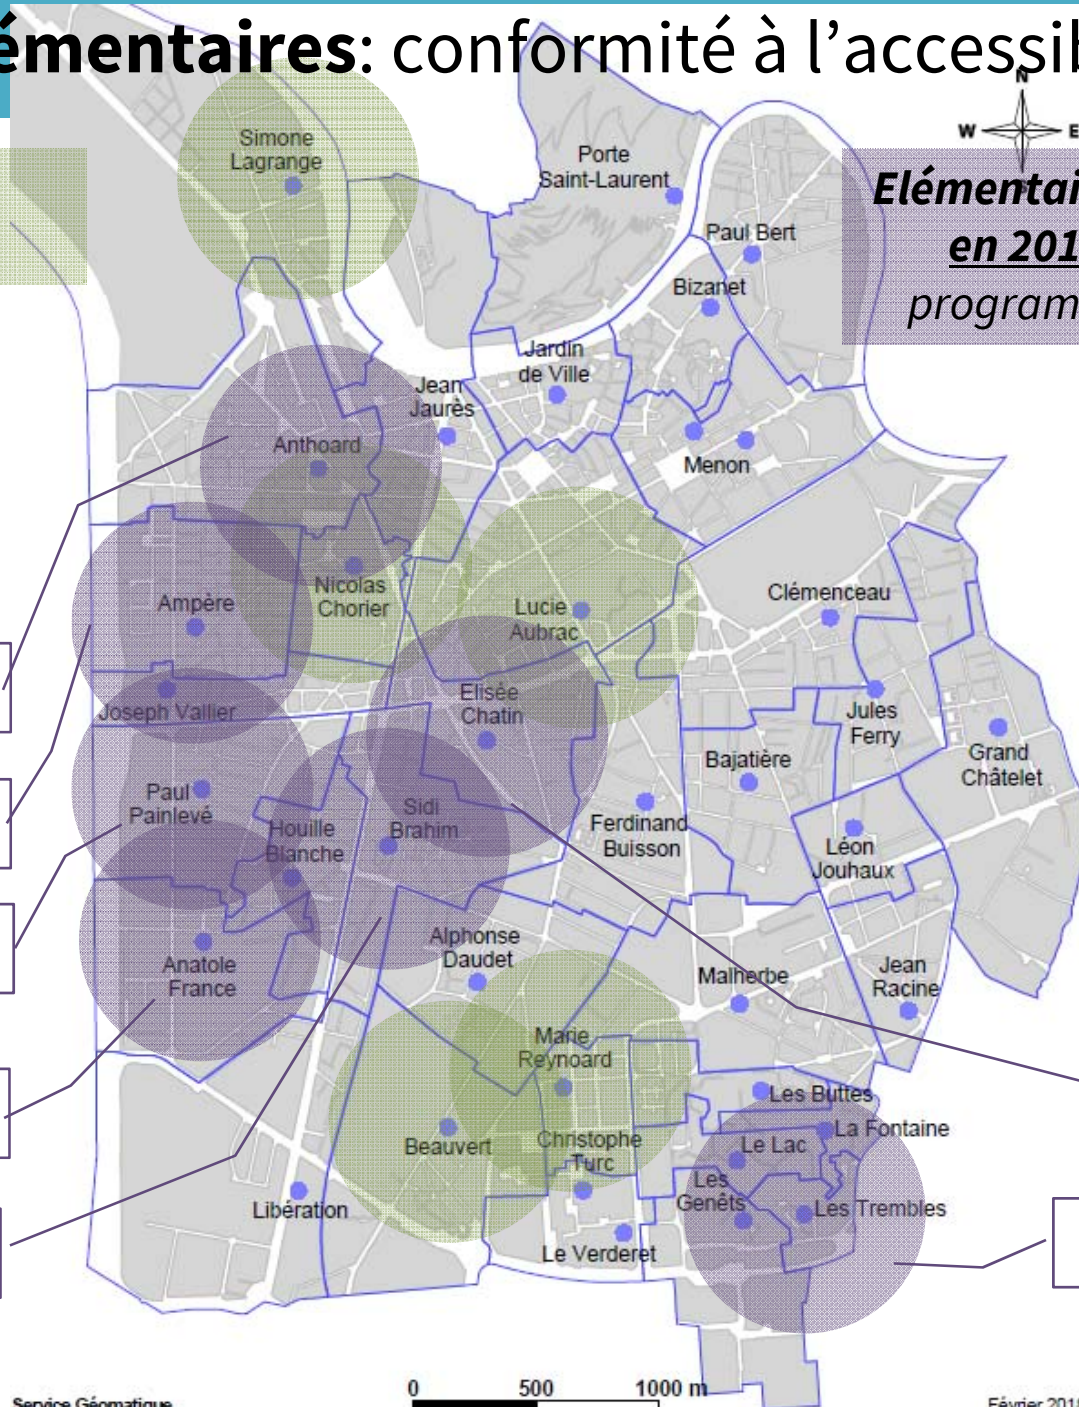



Ecoles maternelles: conformité à l'accessibilité

Maternelles en conformité



Maternelles en conformité en 2019 en fonction de la programmation de travaux

Chantier STB :
Berriat (15 K€)

Livraison F. Arthaud

Ampère : chantier
OSER

Painlevé : chantier
OSER

Chantier STB :
A. France (25 K€)

Chantier STB :
Sidi Brahim (10 K€)

Chantier STB :
Les Frênes (30 K€)



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments socio-culturels

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé /Effectif
Salle Pierre Allard - Annexe MJC Mutualité	Blocs portes entrées, Blocs portes intérieurs, Création sanitaires PMR, Signalétique, Signalétique plus grande pour repérage de l'entrée du bâtiment	Travaux terminés	OUI	64 574 €
Villa Viallet	Traitement ressaut, sécurisation escaliers, mise en conformité sanitaires, vérifier conformité ascenseur	Etude en cours Travaux décembre 2019	OUI	10 000 €
MJC Prémol	Sécurisation escaliers y compris amélioration éclairage, changement tapis sol, création WC adapté au niveau 0, installation BIM à l'accueil	Etude en cours Travaux Toussaint et Décembre 2019	OUI	4 000 €
TOTAL € TTC				78 574 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments territorialisés

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
MDH Centre Ville	Aménagement d'un Espace Famille indépendant (entrée + accueil + service): création d'une rampe d'accès à l'établissement + création d'un WC adapté	Travaux terminés	NON	Travaux neufs – opération globale hors budget Adap
MDH Prémol	Installation BIM accueil	Travaux terminés	OUI	1 683 €
MDH Bois D'Artas	Installation BIM accueil, conformité sanitaires (SIP)	Travaux en cours	OUI	2 000 €
MDH Anatole France	Installation BIM accueil, banque accueil et sanitaires (SIP)	Travaux en cours	OUI	2 500 €
MDH Capuche	Motorisation porte accès, contrastes visuels porte accès, mise en conformité sanitaires adaptés RDC + 1er étage, sécurisation escaliers, BIM	Travaux en cours	OUI	6 900 €
MDH Baladins	Signalétique parois vitrée, tapis PMR, mise en conformité sanitaires adaptés (SIP)	Travaux terminés	OUI	2 251 €
TOTAL € TTC				15 334 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Autres bâtiments publics

NOM BATIMENT	DESCRIPTIF TRX	AVANCEMENT	CONFORME 2019	COÛT € TTC Estimé / Effectif
Marché couvert Halles St Claire	Sécurisation escaliers extérieurs, signalétique rampe accès, signalétique sur parois vitrées portes. Rampe accès ext non conforme et commerces non accessibles traités par dérogation.	Travaux fin 2019	OUI	33 911 €
TOTAL € TTC				33 911 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d'ouvrage Autres bâtiments publics

SECT	NOM BATIMENT	OPERATION	LIVRAISON	REHAB	NEUF	MONTANT ACCESS € TTC
1	Centre de santé des Géants (AGECSA)	-----	2019	X		39 200 Totalemment accessible
